



## Kostensituation neue Stadtbücherei

Budget lt. Beschlüssen des Gemeinderats	EUR
BU 146/2017 (Baubeschluss)	2.300.000
BU 254/2020 (Mehrkosten Gründung)	1.200.000
Beschluss 18.06.2021 (Mehrfläche 50 m²)	50.000
<b>gesamt</b>	<b>3.550.000</b>
ÜpIA wegen LAD und belastetem Material (Puffer abgezogen)	236.000
<b>gesamt</b>	<b>3.786.000</b>

Baukosten	EUR
Bisher angefallen (Stand 06-2023)	1.979.000
Restliche reguläre Baukosten nach Zahlungsplan	1.268.000
Beleuchtung	117.000
Decke, Bodenbeläge	38.000
Bodenbeläge	22.000
Sonstiges (IT, Sanitärbereiche, Lüftung, Teeküche, Glasfaseranbindung u.ä.)	111.000
Planungsmehrkosten, PXL-Zuschlag, Honorar Baubegleitung	98.000
Einrichtung Bücherei	361.000
<b>gesamt</b>	<b>3.994.000</b>

Ergebnis:	Gebäude	Einrichtung	gesamt
Budget	3.430.000	120.000	3.550.000
zu erwartende Gesamtkosten	3.633.000	361.000	3.994.000
<b>Fehlbetrag</b>			<b>-444.000</b>
<b>Fehlbetrag ggü. Haushaltsansatz 2023</b>			<b>-345.000</b>

Einrichtung	EUR
EDV	40.000
RFID	31.000
Einrichtung	208.000
Planungskosten	10.000
Büromöbel	41.000
Umzug	20.000
Bestandsregale	4.000
Grafiker	7.000
<b>gesamt</b>	<b>361.000</b>

### Weiteres Vorgehen:

- Abstimmung im TA (15.6.23)
- Aufträge erteilen
- Beschluss üPIA im TA/GR



## Baffeldecke (Akustikdecke)

Deckensystem, bei dem akustisch wirksame Elemente vertikal von der Rohdecke abgehängt werden. Material: insbes. Mineralfaser und Holzwolle

- Schallabsorption  
→ extrem lärmdämpfend
- entscheidender Beitrag zur Ästhetik in der Bücherei
- gute Revisionsmöglichkeiten






Grundbeleuchtung zwischen den linearen Baffeln:



Grundbeleuchtung zwischen den runden Baffeln:

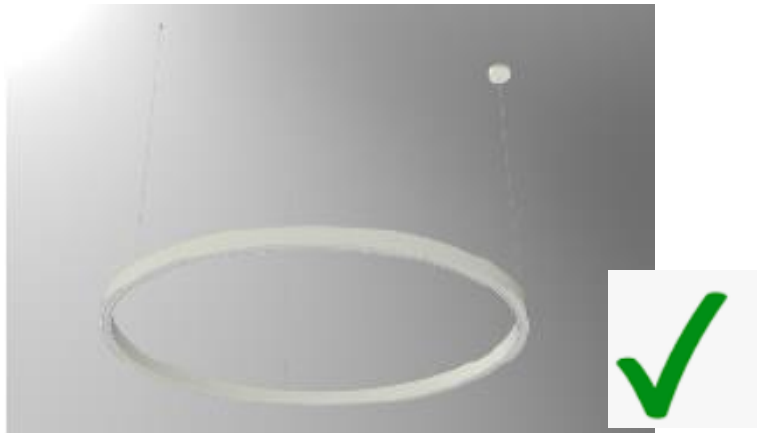

Odenwalddecke/  
Sauerkrautplatte

